


優良技術者説明書

工事番号	特加単 第3号	工事名	加治川第2処理分区(2637他)管渠工事	
施工場所	下中	請負金額	104,852,000円	
工 期	自 令和6年7月3日 至 令和7年3月19日			
施工業者	株式会社 長谷川建設	代表者	長谷川 仁	
現場代理人	田邊 雅樹	主任(監理)技術者	田邊 雅樹	
【工事概要】 施工延長 L=463m 推進工φ200 低耐荷力泥土圧 L=66m 開削工φ150 (リブ管) L=385m 1号マンホール工 N=10基 小型マンホール工(塩ビ製) N=3基 小型マンホール工(レジン製) N=3基 公共ます設置工 N=19箇所		一次下請内容	工 種	推進・立坑・薬液注入工
			〃	開削工・マンホールインバート工
			〃	改良土・残土運搬工
			〃	舗装切断工
			〃	家屋調査工
			〃	交通誘導警備
			業者数	15社
			下請率	
				成績評定点
表彰対象と評価できる内容(選定理由)		【主任監督員】本工事着手前に、試掘ほか各種照査や現場条件を精査し、法線の変更、マンホール配置の変更提案を行うなど、段取り良く工事に着手することができた。また、地下水位の高い軟弱地盤にあつては、ジーメンスウェル工の提案をするなど、常に提案と創意工夫をもって安全で早期に完工させた。工事書類は一覧表や集計表で内容を整理し、書類の簡素化に取り組んでいると感じた。とても見やすく理解しやすい書類であった。以上ほか工事の模範としたい。		
		【総括監督員】当該技術者の作成した施工計画書は現場状況が良く反映されていて、また、安全管理に関する記述においても具体的な内容となっている。施工計画書全般で大変見やすく、吟味された内容となっていて、他工事の模範と成りうる。施工面においても出来映え、品質管理はもとより、工程管理・安全管理についても申し分はない。沿線住民とも良好な関係を築き、苦情等は一切なかった。優良技術者の表彰対象者として十分に推薦できる。		



先導管到達及び貫通状況

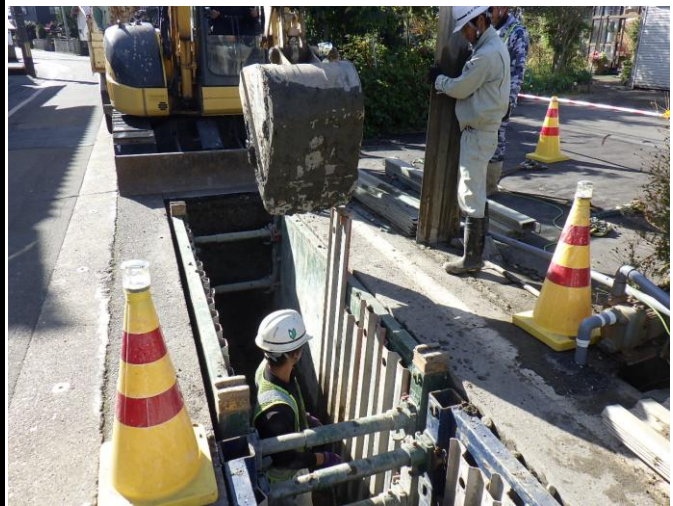

開削状況



ジーメンスウェル工状況
