

優良建設工事説明書

工事番号	下複第10号	工事名	新発田東部処理分区舗装復旧(t177-11他)工事
施工場所	東新町1丁目ほか	請負金額	56,749,000円
工 期	自 令和7年9月11日 至 令和8年2月27日		
施工業者	フジマ舗道株式会社	代表者	代表取締役 遠藤 圭介
現場代理人	池田 貞史	主任(監理)技術者	池田 貞史
【工事概要】 舗装本復旧 アスファルト舗装工 A=8,570m ² 区画線工 N=1式	一次下請内容	工 種	舗装版切断工
		工 種	区画線設置工
		工 種	舗装版破碎工
		工 種	交通誘導警備
		工 種	舗装
		業者数	5社
	成績評定点	87	

表彰対象と評価できる
内容(選定理由)

【主任監督員】安全管理の面では、小学校に近接する工事箇所であったことから、事前の工事周知を徹底するとともに、通学時間帯における交通誘導員を適正に配置し、工期を通じて無事故で工事を完成させた。情報発信の面では、本工事専用のホームページを随時更新し、現場のQRコードから誰でも最新の工程状況を確認できる仕組みを構築するなど、住民への周知に工夫を凝らした点が高く評価できる。

【検査員】工事完成書類は全般的に過不足なく、見やすく整理されており、特に品質管理及び出来形管理については、わかりやすい示し方で作成されていた。周辺住民に対し、工事のお知らせをチラシで配布するだけでなく、自社HPアクセス用のQRコードをチラシに示し、本日の施工予定区間や通行可能な迂回路を、携帯電話でも見られるよう情報発信していた。

【説明を補足する写真、図面、略図】



着手前



竣工



HPによる工事箇所や迂回路の案内(QRコード読込)



アスファルト舗設状況

優良建設工事説明書


工事番号	下複第14号	工事名	新発田北部処理分区舗装復旧(h325他)工事	
施工場所	新発田市 緑町1丁目 地内	請負金額	11,022,000 円	
工 期	自 令和 7年10月17日 至 令和 8年 1月29日			
施工業者	㈱加賀田組下越営業所	代表者	所長 清水 周	
現場代理人	清田 学	主任(監理)技術者	清田 学	
【工事概要】 アスファルト舗装工(車道) A=1,407㎡ アスファルト舗装工(歩道) A= 101㎡ 区画線工 1式		一次下請内容	工 種	舗装切断
			〃	打換工
			〃	舗装版破碎・積込
			〃	区画線設置
			〃	交通誘導
		業者数	5社	
		下請率		
		成績評定点		81

表彰対象と評価できる 内容(選定理由)	【主任監督員】 住宅が連担する場所での舗装復旧工事であったが、片側交互通行時には交通誘導員の適切な配置により苦情等もなく工事を行っていた。また、通行止めでの施工箇所において、臨時駐車場を設け、沿線住民に周知し、車両の出入りに配慮して工事を行っていた。結果的に施工上の安全も確保し、工事を完了させた。
	【検査員】 全体的に良好な出来栄であった。既存マンホール蓋や道路側溝へのすり付けが丁寧であった。転圧によるAs合材の目の粗さ等は全区間均一で、滑らかな表層となっていた。

【説明を補足する写真、図面、略図】



片側交互通行時の交通誘導員配置状況

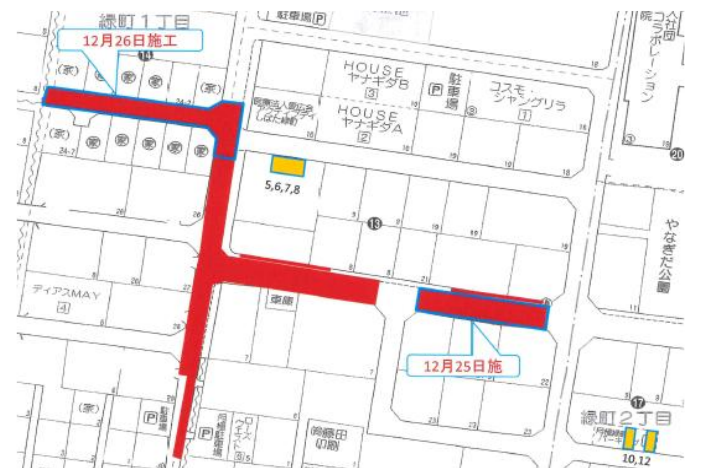

通行止めで設けた臨時駐車場
