


優良若手技術者説明書 推薦技術者【 宮良 成紀 】

工事番号	教受繰第2号	工事名	新発田市立本丸中学校長寿命化改良工事(中棟 電気設備)	
施工場所	新発田市緑町2丁目 地内	請負金額	56,430,000円	
工 期	自 令和 7年 5月 16日 至 令和 8年 3月 20日			
施工業者	大進電業 株式会社	代表者	代表取締役 安西 拓	
現場代理人	宮良 成紀	主任(監理)技術者	宮良 成紀	
【工事概要】 1.変電設備(キュービクル)改修工事 3連1基キュービクル撤去・据付 2.電灯設備改修工事 既設照明器具及び配線器具撤去、新設工事 他 3.機械設備・外壁改修に伴う電気工事 消防設備機械改修に伴う電気配管配線工事 他		一次下請内容	工 種	電気設備工事
			〃	通信設備工事
			〃	火災報知設備工事
			〃	避雷針設備工事
			〃	あと施工アンカー工事
			〃	変電設備搬入・据付工事
			業者数	6社
他工事一式		成績評定点	83点	
表彰対象と評価できる内容(選定理由)		【主任監督員】 本工事では、複数工事が絡む改修工事で、統括する建築工事施工者のもと、安全管理と品質管理に優れた技術力を発揮した。改修工事で特に重要な、現地調査を入念に行い、設計意図が施工に反映されるための考察も細かくされていた。また、安全管理の配慮も緻密であり、特に防火スクリーン降下時の安全確保のためのブザー設置や、緊急時の初動を迅速にするための個人カードの携行など、工夫を凝らしていた。		
		【総括監督員】 別発注の建築工事、機械設備工事との連携が不可欠な改修工事であったが、統括する建築工事ゼネコンのもと、各業者とも品質管理と安全管理等に努め、監理技術者が若手らしい最新の優れた技術力を発揮した。安全管理においては、防火スクリーン降下時の安全確保のためのブザー設置や、緊急時の初動を迅速にするための個人カードの携行などの創意工夫をした。また、本工事の設計図書を十分に把握し施工前の設計照査を行い改修工事に有りがちな現状との差異を見出しながら監督職員に提案し、使い勝手等を考慮しながら進捗させた。		

創意工夫：緊急連絡先の工夫

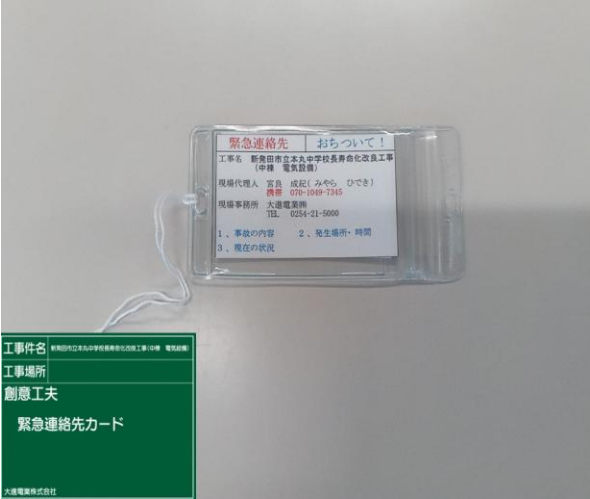


作業員一人一人に名刺サイズほどの「緊急連絡先カード」を携帯させるという独自の取組を提案・実施し、現場の安全管理の向上に大きく寄与した。カードには連絡手段並びに状況説明
順番等を明記することによって、迅速かつ確実に関係者へ連絡が行える体制を構築した点は高く評価できる。

創意工夫：防火スクリーン用降下ブザー取付



建築工事で設置した防火スクリーン降下時に周囲の避難者が気付かず接触する危険性を踏まえ、降下動作に連動して鳴動するブザーを追加設置し、避難者の安全性向上に寄与する改善策を自主的に提案・実施した点は高く評価できる。

優良若手技術者説明書 推薦技術者【 中村 祐二 】

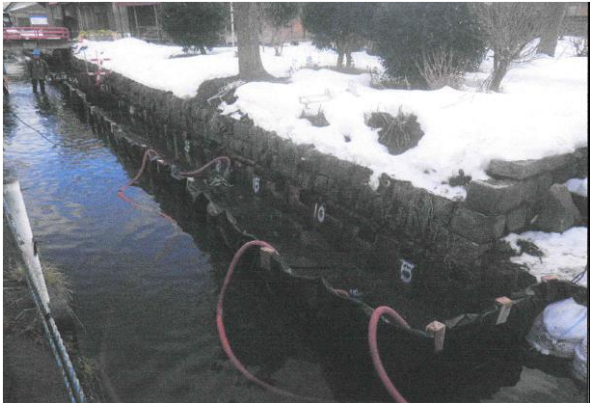工事番号	街環第2号	工事名	街なみ環境整備事業(水のみち地区)整備工事	
施工場所	大栄町1丁目地内	請負金額	15,312,000円	
工 期	自 令和7年11月26日 至 令和8年3月5日			
施工業者	株式会社中村組	代表者	代表取締役 中村 俊一	
現場代理人	中村 祐二	主任(監理)技術者	中村 祐二	
【工事概要】 左岸護岸工 L=36m ブロック積工 A=55m2 家屋調査 N=2件	一次下請内容	工 種	護岸ブロック積工	
		〃	交通管理工	
		〃	家屋調査	
		業者数	3社	
		下請率		
	成績評定点	82点		
表彰対象と評価できる 内容(選定理由)	【主任監督員】 狭隘な生活道路を規制しての工事であったことや、関連する町内会も多く、工程調整等を主体的に行うことにより、トラブルなく工事を終えることができた。また、品質、出来形、安全管理において秀でていたことは他の模範とするところである。			
	【総括監督員】 当工事は、冬期の市街地での施工であったが、関連する町内会と調整を行うことで、公衆災害防止に万全な体制を築き、苦情やトラブルなく安全に完了することができた。また、新規入場者には、安全確認資料を作成し教育することで、現場代理人として労働災害防止を徹底していた。安全管理は、リーダーシップを発揮し、積極的に取り組んでいたため特に評価できると考える。			
【説明を補足する写真、図面、略図】				
<div><div><p>仮締切工完了</p></div><div><p>ブロック積1段目完了</p></div><div><p>護岸工完了</p></div></div>				
